

филиал ПУ "Речицагаз"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(должность)

(подпись)

Д.Ф. Воробей
(инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 15 " января 2021 г. № 28 в составе:

председатель комиссии	<u>главный инженер</u> (должность)	<u>А.Н.Полторан</u> (инициалы, фамилия)
зам.председателя комиссии	<u>нач. ПТО</u> (должность)	<u>Г.В.Черношей</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>нач. СЭЭО и ЗГК</u> (должность)	<u>С.И.Ерошенко</u> (инициалы, фамилия)
	<u>зам. гл. бухгалтера</u> (должность)	<u>Н.В.Белая</u> (инициалы, фамилия)
	<u>нач.БЗ</u> (должность)	<u>И.Ю.Захарченко</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт железобетонного ограждения территории Брагинского РГС расположенного по адресу: г.п.Брагин, ул.Челидзе 41А. установлено, что

Железобетонное ограждение имеет отклонение по вертикали (272 м.п., количество панелей 68 шт), частично имеется проседания бетонных блоков железобетонного ограждения по горизонтали (68шт.). Отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя (643 м2), внутренняя часть ограждения не окрашена. Размеры определены по фактическим обмерам.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются

(перечень факторов)

Работы следует проводить с применением следующих механизмов: кран автомобильный

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ НЕТ

председатель комиссии	<u>главный инженер</u> (должность)	<u>А.Н.Полторан</u> (инициалы, фамилия)
зам.председателя комиссии	<u>нач. ПТО</u> (должность)	<u>Г.В.Черношей</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>нач. СЭЭО и ЗГК</u> (должность)	<u>С.И.Ерошенко</u> (инициалы, фамилия)
	<u>зам. гл. бухгалтера</u> (должность)	<u>Н.В.Белая</u> (инициалы, фамилия)
	<u>нач.БЗ</u>	<u>И.Ю.Захарченко</u>

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Выравнивание железобетонного ограждения в вертикальную плоскость при помощи автомобильного крана	м.п.	272	
2	Бетонирование основания блоков железобетонного ограждения	шт	68	
3	Сплошная очистка поверхности металлическими счетками	м2	1170	
4	Огрунтовка поверхности плит	м2	1170	
5	Покраска поверхности акриловыми красками	м2	1170	

Составил

Синицаев БЗ

(должность)

[Подпись]

(подпись)


В.С. Давыдов

(инициалы, фамилия)

" " _____ 20__ г.

ОБЪЕКТ: « Текущий ремонт железобетонного ограждения территории Брагинского РТС» в г.п. Брагин ул. Челидзе, 41а.

Наименование		Предполагаемые виды работ
Забор железобетонный (остаточная стоимость)	281,28	1. Демонтаж стеновых панелей – 19 шт. 2. Демонтаж ж/б стаканов. 3. Укладка ж/б стаканов. 4. Установка стеновых панелей – 19 шт. 5. Очистка стен от старой краски. 6. Огрунтовка поверхности стен. 7. Окраска стен ж/б забора.
Описание: (блочное, кирпичное, его общая площадь м2); Количество этажей; Количество окон всего и на каждом этаже; Количество дверей всего и на каждом этаже; Количество санузлов всего и на каждом этаже	Железобетонное ограждение - 68 плит (2,15×4,0)	
Инвентарный №	013510	
Шифр классификатора	20352	
Фактический срок эксплуатации/нормативный срок, лет.	27/30	
Дата ввода в эксплуатацию	01.12.1994	
Дата регистрации	-	
Дата последнего капитального ремонта	-	
Дата последней реконструкции или модернизации	-	
Составил:		


(подпись)


(подпись)


(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

Согласовано:

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)


(Ф.И.О.)

(должность)

(должность)

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

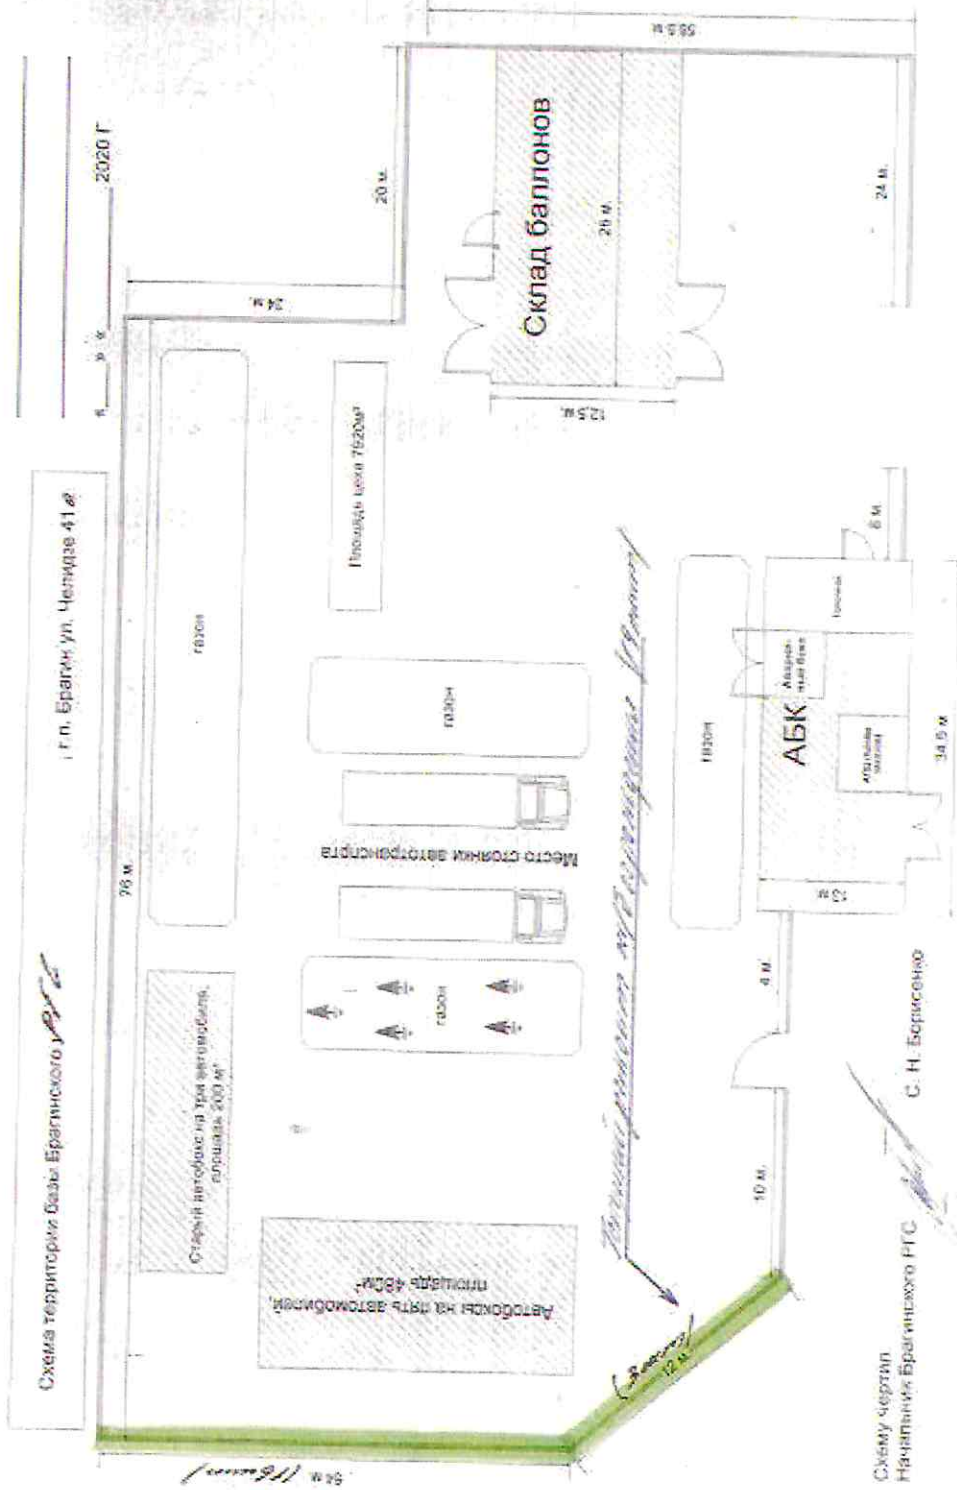

Схему чертил
Начальник Брагинского РТС
С. Н. Берисенко
